


Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020				2021				2022				2023				2024			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zuidas Overall																							
Thema's																							
Zuidas Hoofdinfrastructuur																							
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Boelelaan, zuidelijke o	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: Parnassusweg/Boelelaan, fietsoversteek:	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: Amstelveenseweg/Fred Roeskestraat, fie	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: 3 fietsoverstekten Olympiaplein, Stadionw	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: Europaplein/Rooseveltlaan, fietsoverste	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: Europaplein/Kennedylaan, fietsoverste	4	29-6-2020*	24-7-2020																				
Quick wins Fiets: Wielingenstraat, fietsoversteek: uitvoering	4	21-12-2020*	15-1-2021																				
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kru	3	14-9-2020*	2-10-2020																				
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	16	14-12-2020*	1-4-2021																				
De Boelelaan Midden: uitvoering	85	13-9-2021	28-4-2023																				
Zuidas Deelgebieden																							
Verdi																							
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																							
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw kar	128	6-3-2020	18-8-2022																				
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, b	104	18-8-2023	14-8-2025																				
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJbaanpad noordzijde, geb																							
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 1: sl	128	19-7-2021	29-12-2023																				
NO-kwadrant, tpv Burgerweeshuis, won, fase 2A & 2B: slo	128	11-3-2024	21-8-2026																				
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 3: sl	128	28-1-2030*	9-7-2032																				
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																							
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	78	19-7-2021	13-1-2023																				
Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: sloop en bouw	33	6-11-2023	21-6-2024																				
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: uitvoering incl	104	24-6-2024	19-6-2026																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk: sloop 2e deel sporthalk	33	31-8-2026	16-4-2027																				
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk: bouw incl maaiveld	104	3-5-2027	27-4-2029																				
NO, tpv Pand Zuid, transformatie tot woningen: bouw	104	3-5-2027	27-4-2029																				
NW, Frans Ottenstadion: bestaande erfpacht, uitvoering, in	130	20-4-2022	15-10-2024																				
Verdi, deelplan 3, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
ZW, Bedrijventerrein: uitvoering, indicatief	130	19-1-2026	14-7-2028																				
ZW, Jachthavengebied: uitvoering, indicatief	130	19-1-2026	14-7-2028																				
Verdi, deelplan 4, Waternet-terrein, gebiedsontwikkeling, indicatief																							
ZO, Pompstation Amstelveenseweg: bouwrijp maken, indic	33	12-3-2027	28-10-2027																				
ZO, Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, wor	104	29-10-2027	25-10-2029																				
ZO, Meerparc-terrein, sloop en woningbouw, indicatief	128	31-8-2026	9-2-2029																				
Roeskestraat																							
Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																							
Roeskestraat, kavel III: sloop	12	28-6-2021	17-9-2021																				
Roeskestraat, kavel III: bouwrijp maken	8	20-9-2021	12-11-2021																				
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot inhuizing	65	3-1-2022	31-3-2023																				
Parnas (Rechtbank)																							
Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte																							
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor	161	2-10-2017 A	16-10-2020																				
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	9	19-10-2020	16-12-2020																				
Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte: uitvoering	29	28-5-2020	16-12-2020																				
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	28	6-4-2020	16-10-2020																				
Parnassusweg, fietsroute bij nieuwbouw Rechtbank: aanpa	78	2-7-2018 A	27-12-2019 A																				
Parnas, gebiedsontwikkeling																							
Parnas, kavels C2/C3 lokatie tijdelijke rechtbank : demonte	65	1-7-2021	28-9-2022																				
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	8	12-8-2024	4-10-2024																				
Strawinsky																							
Strawinsky, 2Amsterdam																							
2Amsterdam, parkeergarage: bouw tot 0-vlber	82	1-10-2018 A	25-10-2019 A																				
E. van Beijnumstraat, fase 1, aanleg K&L, fundering weg en	28	2-9-2019 A	27-4-2020																				
E. van Beijnumstraat, tijdelijke openstelling voor bouwverke	0	28-4-2020																					
2Amsterdam, parkeergarage: afbouw	52	28-10-2018	23-10-2020																				
2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel	95	1-10-2018 A	27-11-2020																				
2Amsterdam, noordelijke toren: verbouw tot kantoor incl de	83	28-10-2018	28-5-2021																				
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	39	31-8-2020	28-5-2021																				
Strawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreiding																							
WTC-uitbreiding kantoorruimte: sloop toren D en bouw Tow	113	7-1-2019 A	19-11-2021																				
WTC-uitbreiding kantoorruimte: maaiveldinrichting	13	22-11-2021	18-2-2022																				
Strawinskylaan																							
Strawinskylaan, werkzaamheden Nuon en Waternet en aan	10	1-7-2019 A	28-2-2020																				
Strawinskylaan, talud: uitvoering incl bomen planten en groen	17	3-2-2020	29-5-2020																				
Strawinskylaan talud oostzijde: uitvoering (na WTC)	45	22-11-2021	30-9-2022																				
Fietspad Strawinskylaan + talud: uitvoering (igv 2 fasen: laa	17	3-10-2022	27-1-2023																				
Herinrichting Prinses Irenestraat																							
Prinses Irenestraat westzijde, drainage en groen: uitvoering	30	12-12-2022*	7-7-2023																				
Beethoven																							
Beethoven, fase 2																							
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassing fietsroutes	16	4-11-2019 A	21-2-2020																				
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: periode bouwrijp maken	24	13-1-2020*	26-6-2020																				
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: verleggen kabels en leidingen	4	20-4-2020	15-5-2020																				
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water 6,7	9	13-7-2020	11-9-2020																				
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																							
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	1-6-2021	30-5-2022																				
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	103	31-5-2022	20-5-2024																				
Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling																							
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	84	12-12-2022	19-7-2024																				
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																							
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	22-7-2024	18-7-2025																				
Beethoven, Convict & Kapel																							
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken	4	23-11-2020	18-12-2020																				

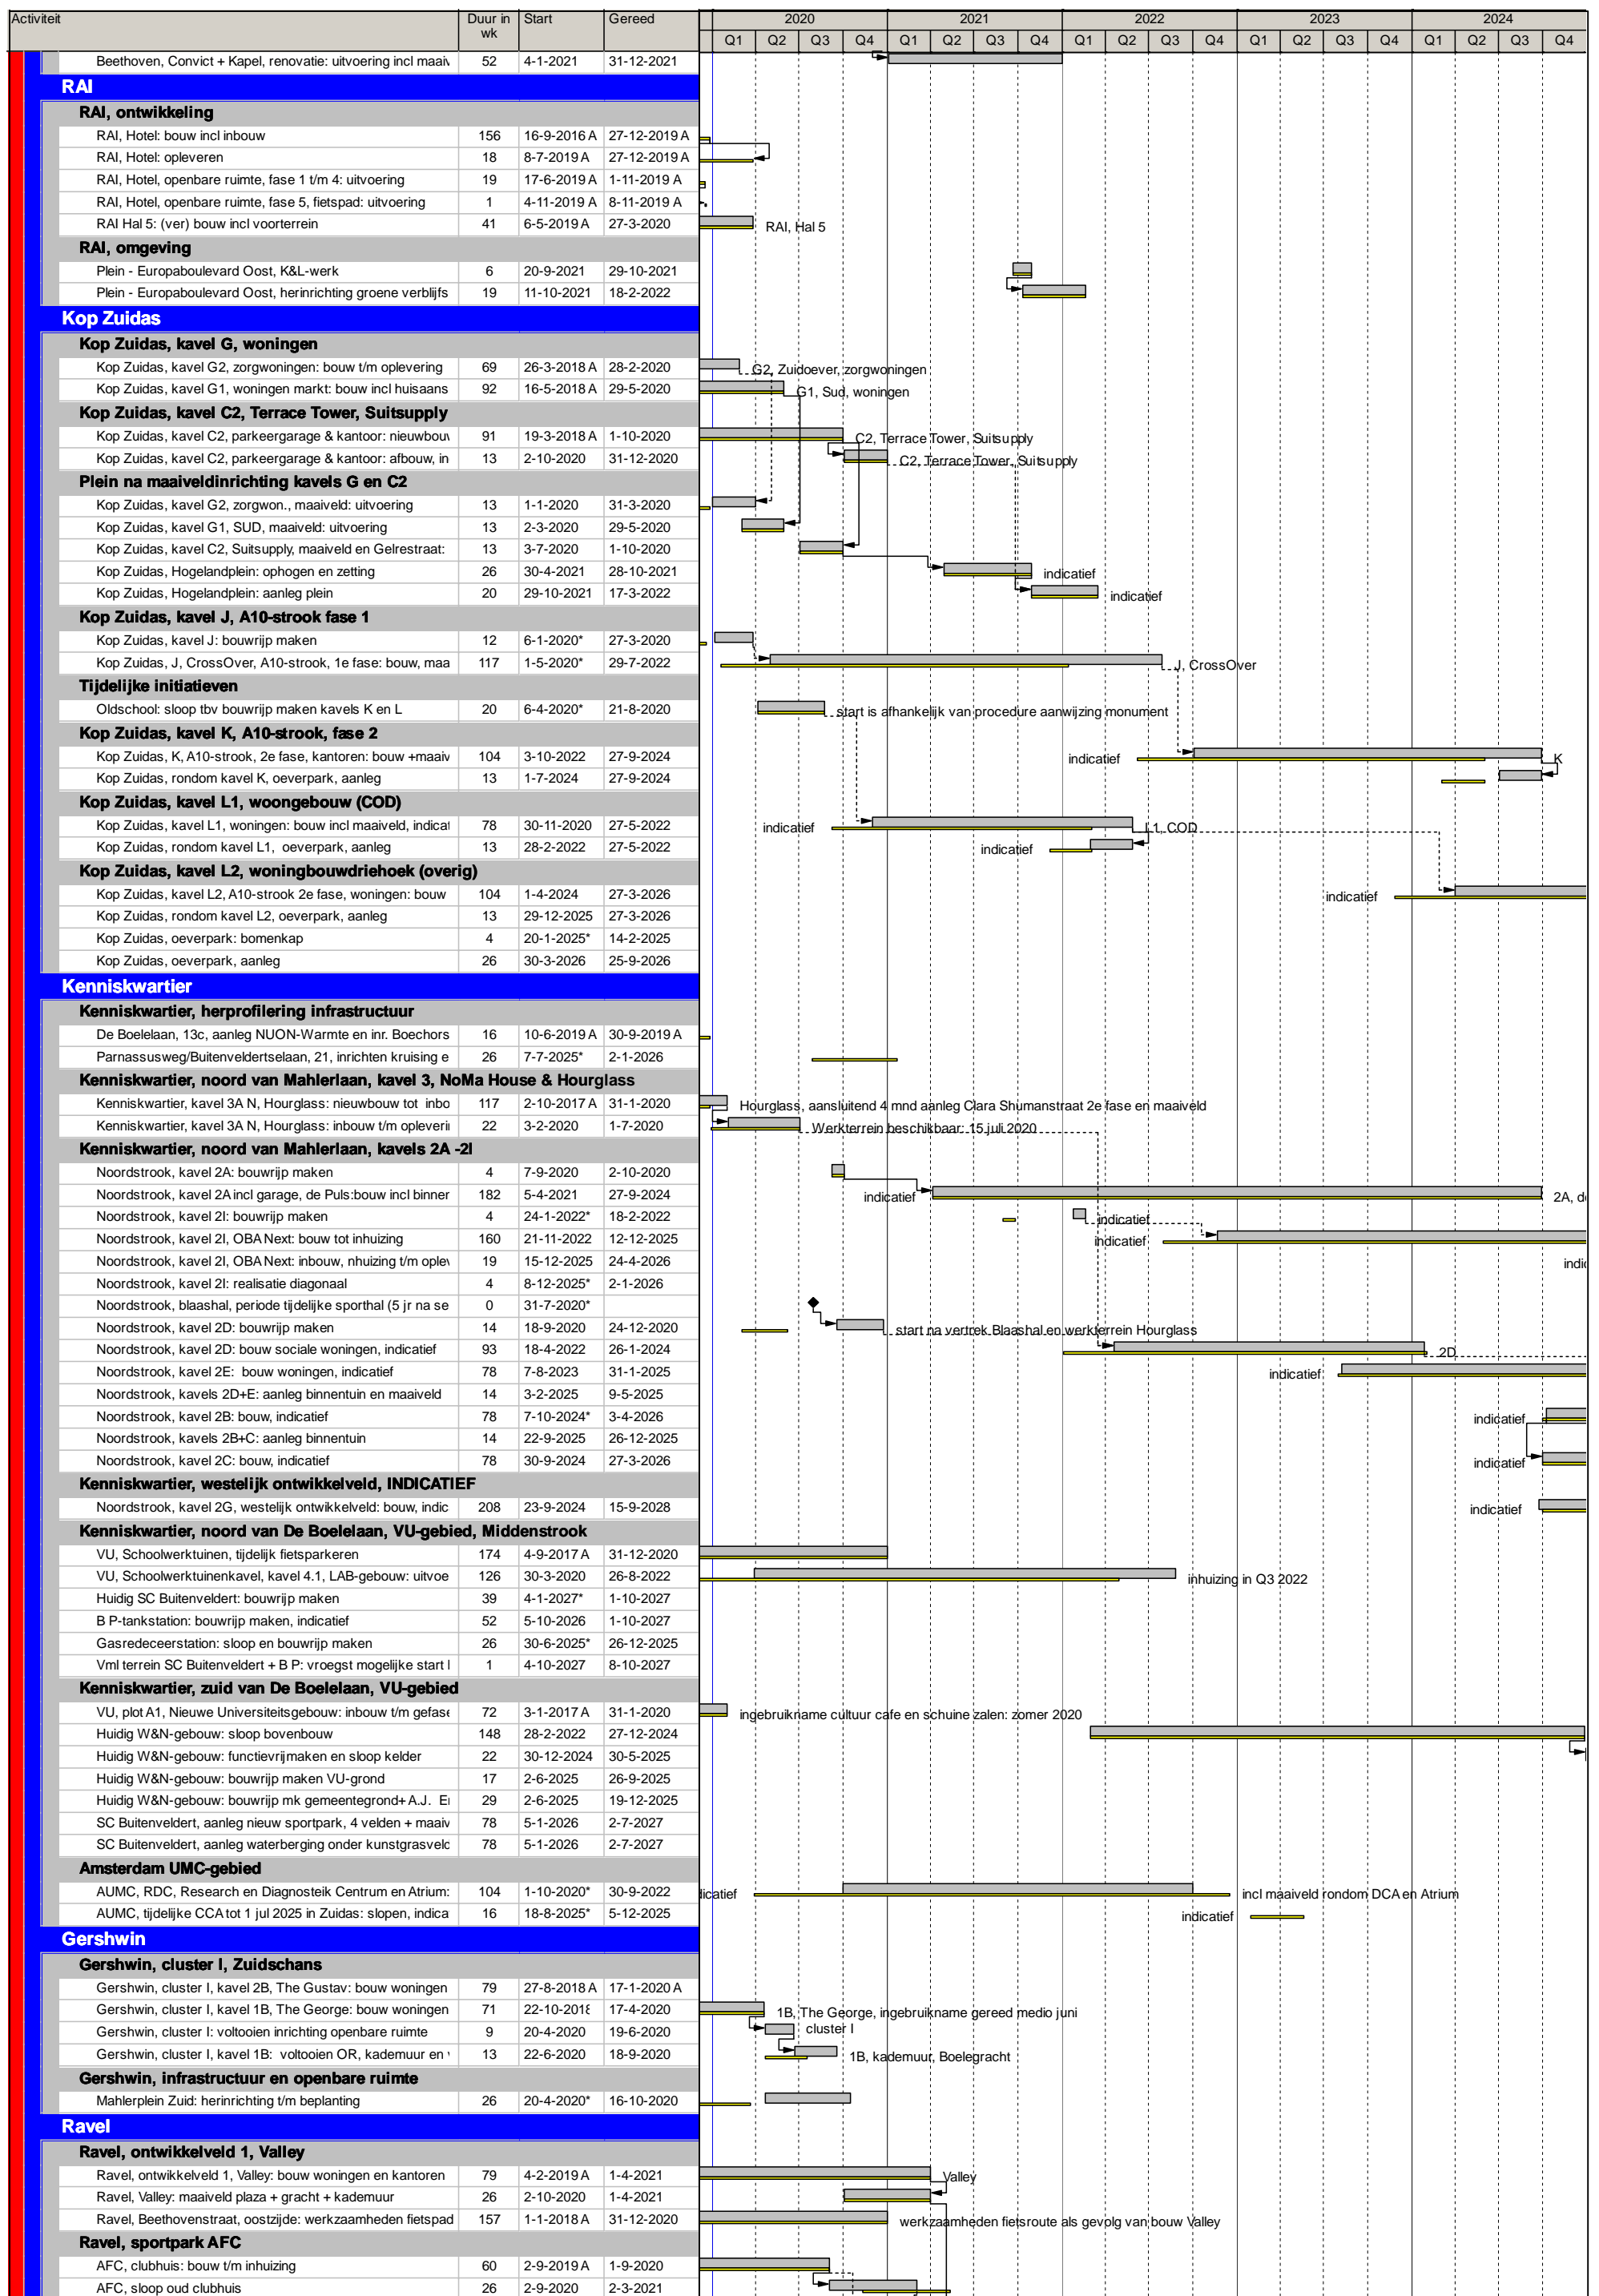

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020				2021				2022				2023				2024			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AFC, velden 1-4: aanleggen																							
AFC, velden 1-4: aanleggen	38	12-8-2019 A	1-5-2020																				
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen																							
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen	10	4-5-2020	10-7-2020																				
AFC, kademuur: aanleggen (start na maaiveld en kademuur)																							
AFC, kademuur: aanleggen (start na maaiveld en kademuur)	24	16-10-2020	1-4-2021																				
AFC, veld 5: aanleggen																							
AFC, veld 5: aanleggen	12	2-4-2021	24-6-2021																				
AFC, veld D: sloop en verwijderen																							
AFC, veld D: sloop en verwijderen	6	25-6-2021	5-8-2021																				
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																							
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering																							
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering	26	23-11-2020	21-5-2021																				
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering																							
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering	26	24-5-2021	19-11-2021																				
Ravellaan: bovengronds: uitvoering																							
Ravellaan: bovengronds: uitvoering	26	22-11-2021	20-5-2022																				
Ravellaan: bovengronds: afrondende werkzaamheden																							
Ravellaan: bovengronds: afrondende werkzaamheden	12	23-5-2022	12-8-2022																				
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering, indicatief																							
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering, indicatief	78	26-6-2024	23-12-2025																				
Ravel, tijdelijke functies																							
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd																							
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																					
Tijdelijke school IKC: einde gebruik																							
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	1-5-2024*																					
Tijdelijke school IKC: sloop																							
Tijdelijke school IKC: sloop	8	1-5-2024	25-6-2024																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen: bouw	143	19-12-2022	12-9-2025																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F: bouw woning	124	3-5-2027	14-9-2029																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	10-6-2030	22-10-2032																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken	26	24-1-2033	22-7-2033																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief	78	25-7-2033	19-1-2035																				
Vivaldi																							
Vivaldi, Breevast-kavel																							
Vivaldi, Vivaldistraat: sbop oud gemaal																							
Vivaldi, Vivaldistraat: sbop oud gemaal	16	11-1-2021*	30-4-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: verwijderen parkeerplek																							
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: verwijderen parkeerplek	12	3-5-2021	23-7-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: omleggen K&L																							
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: omleggen K&L	20	23-5-2021	7-10-2022																				
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering																							
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	125	10-10-2022	28-2-2025																				
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte																							
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	14	25-11-2024	28-2-2025																				
Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief																							
Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief	20	3-3-2025	18-7-2025																				
Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14																							
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw																							
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw	89	6-11-2017 A	29-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en																							
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en	26	2-12-2019 A	29-5-2020																				
Vivaldi, EMA, kavel 12																							
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw																							
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw	77	18-6-2018 A	15-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld																							
A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld	13	26-8-2019 A	15-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw																							
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	13	16-12-2019	24-4-2020																				
Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13																							
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen																							
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	12	8-5-2023	28-7-2023																				
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld, indicatief																							
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld, indicatief	104	13-11-2023	7-11-2025																				
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																							
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken																							
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken	4	17-4-2023*	12-5-2023																				
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting, tegelijk met o																							
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting, tegelijk met o	13	2-12-2024	28-2-2025																				
Vivaldi, 150 kV-station, Zorgvlied station (Liandon)																							
Liandonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m o																							
Liandonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m o	13	27-1-2020*	24-4-2020																				
Zuidasdok																							
Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden Zuidplus																							
Uitvoering																							
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 2-3																							
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 2-3	9	11-2-2019 A	8-11-2019 A																				
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 1, 5-6																							
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 1, 5-6	26	5-10-2020*	2-4-2021																				
Zuidas: omgeving																							
Thema's																							
Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzw niet in deelgebieden																							
Amstelveenlijn, uitvoering kruispunten, vernieuwen haltes (A)																							
Amstelveenlijn, uitvoering kruispunten, vernieuwen haltes (A)	82	6-8-2018 A	27-3-2020																				
Amstelveenlijn, testfase (Amstelveen)																							
Amstelveenlijn, testfase (Amstelveen)	40	30-3-2020	31-12-2020																				
Amstelveenlijn, afronding en ingebruik (Amstelveen)																							
Amstelveenlijn, afronding en ingebruik (Amstelveen)	12	1-1-2021	25-3-2021																				
Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR)																							
Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR)	104	6-1-2020*	31-12-2021																				
Buitenveldertseleaan, groot onderhoud (V&OR)																							
Buitenveldertseleaan, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																				
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting																							
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting	39	1-10-2019 A	26-6-2020																				
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervangning (N)																							
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervangning (N)	39	6-4-2020*	1-1-2021																				
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervangning (M)																							
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervangning (M)	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervangning (MET)																							
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervangning (MET)	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Omgeving																							
Werken derden																							
Ten N van Strawinsky, Beethovenstraat w-zijde, W. Kesstr:																							
Ten N van Strawinsky, Beethovenstraat w-zijde, W. Kesstr:	52	6-5-2019 A	1-5-2020																				
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O)																							
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O)	30	30-9-2019 A	24-4-2020																				
Buitenveldertseleaan, ten Z v De Boelelaan, groot onderhoud (V&O)																							
Buitenveldertseleaan, ten Z v De Boelelaan, groot onderhoud (V&O)	31	1-4-2022*	1-11-2022																				
Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte																							
Station RAI, fase 2, uitbreiding metrohal en bouw fietsenstal																							
Station RAI, fase 2, uitbreiding metrohal en bouw fietsenstal	35	1-10-2018 A	3-4-2020																				
Station RAI, verwijderen tijdelijke fietsrekken																							
Station RAI, verwijderen tijdelijke fietsrekken	2	6-4-2020	17-4-2020																				
Station RAI, definitief maaiveld rondom noordelijke uitbreidin																							
Station RAI, definitief maaiveld rondom noordelijke uitbreidin	3	10-8-2020	28-8-2020																				
