


Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk
Geel: targetplanning 3e kwartaal 2018

Disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

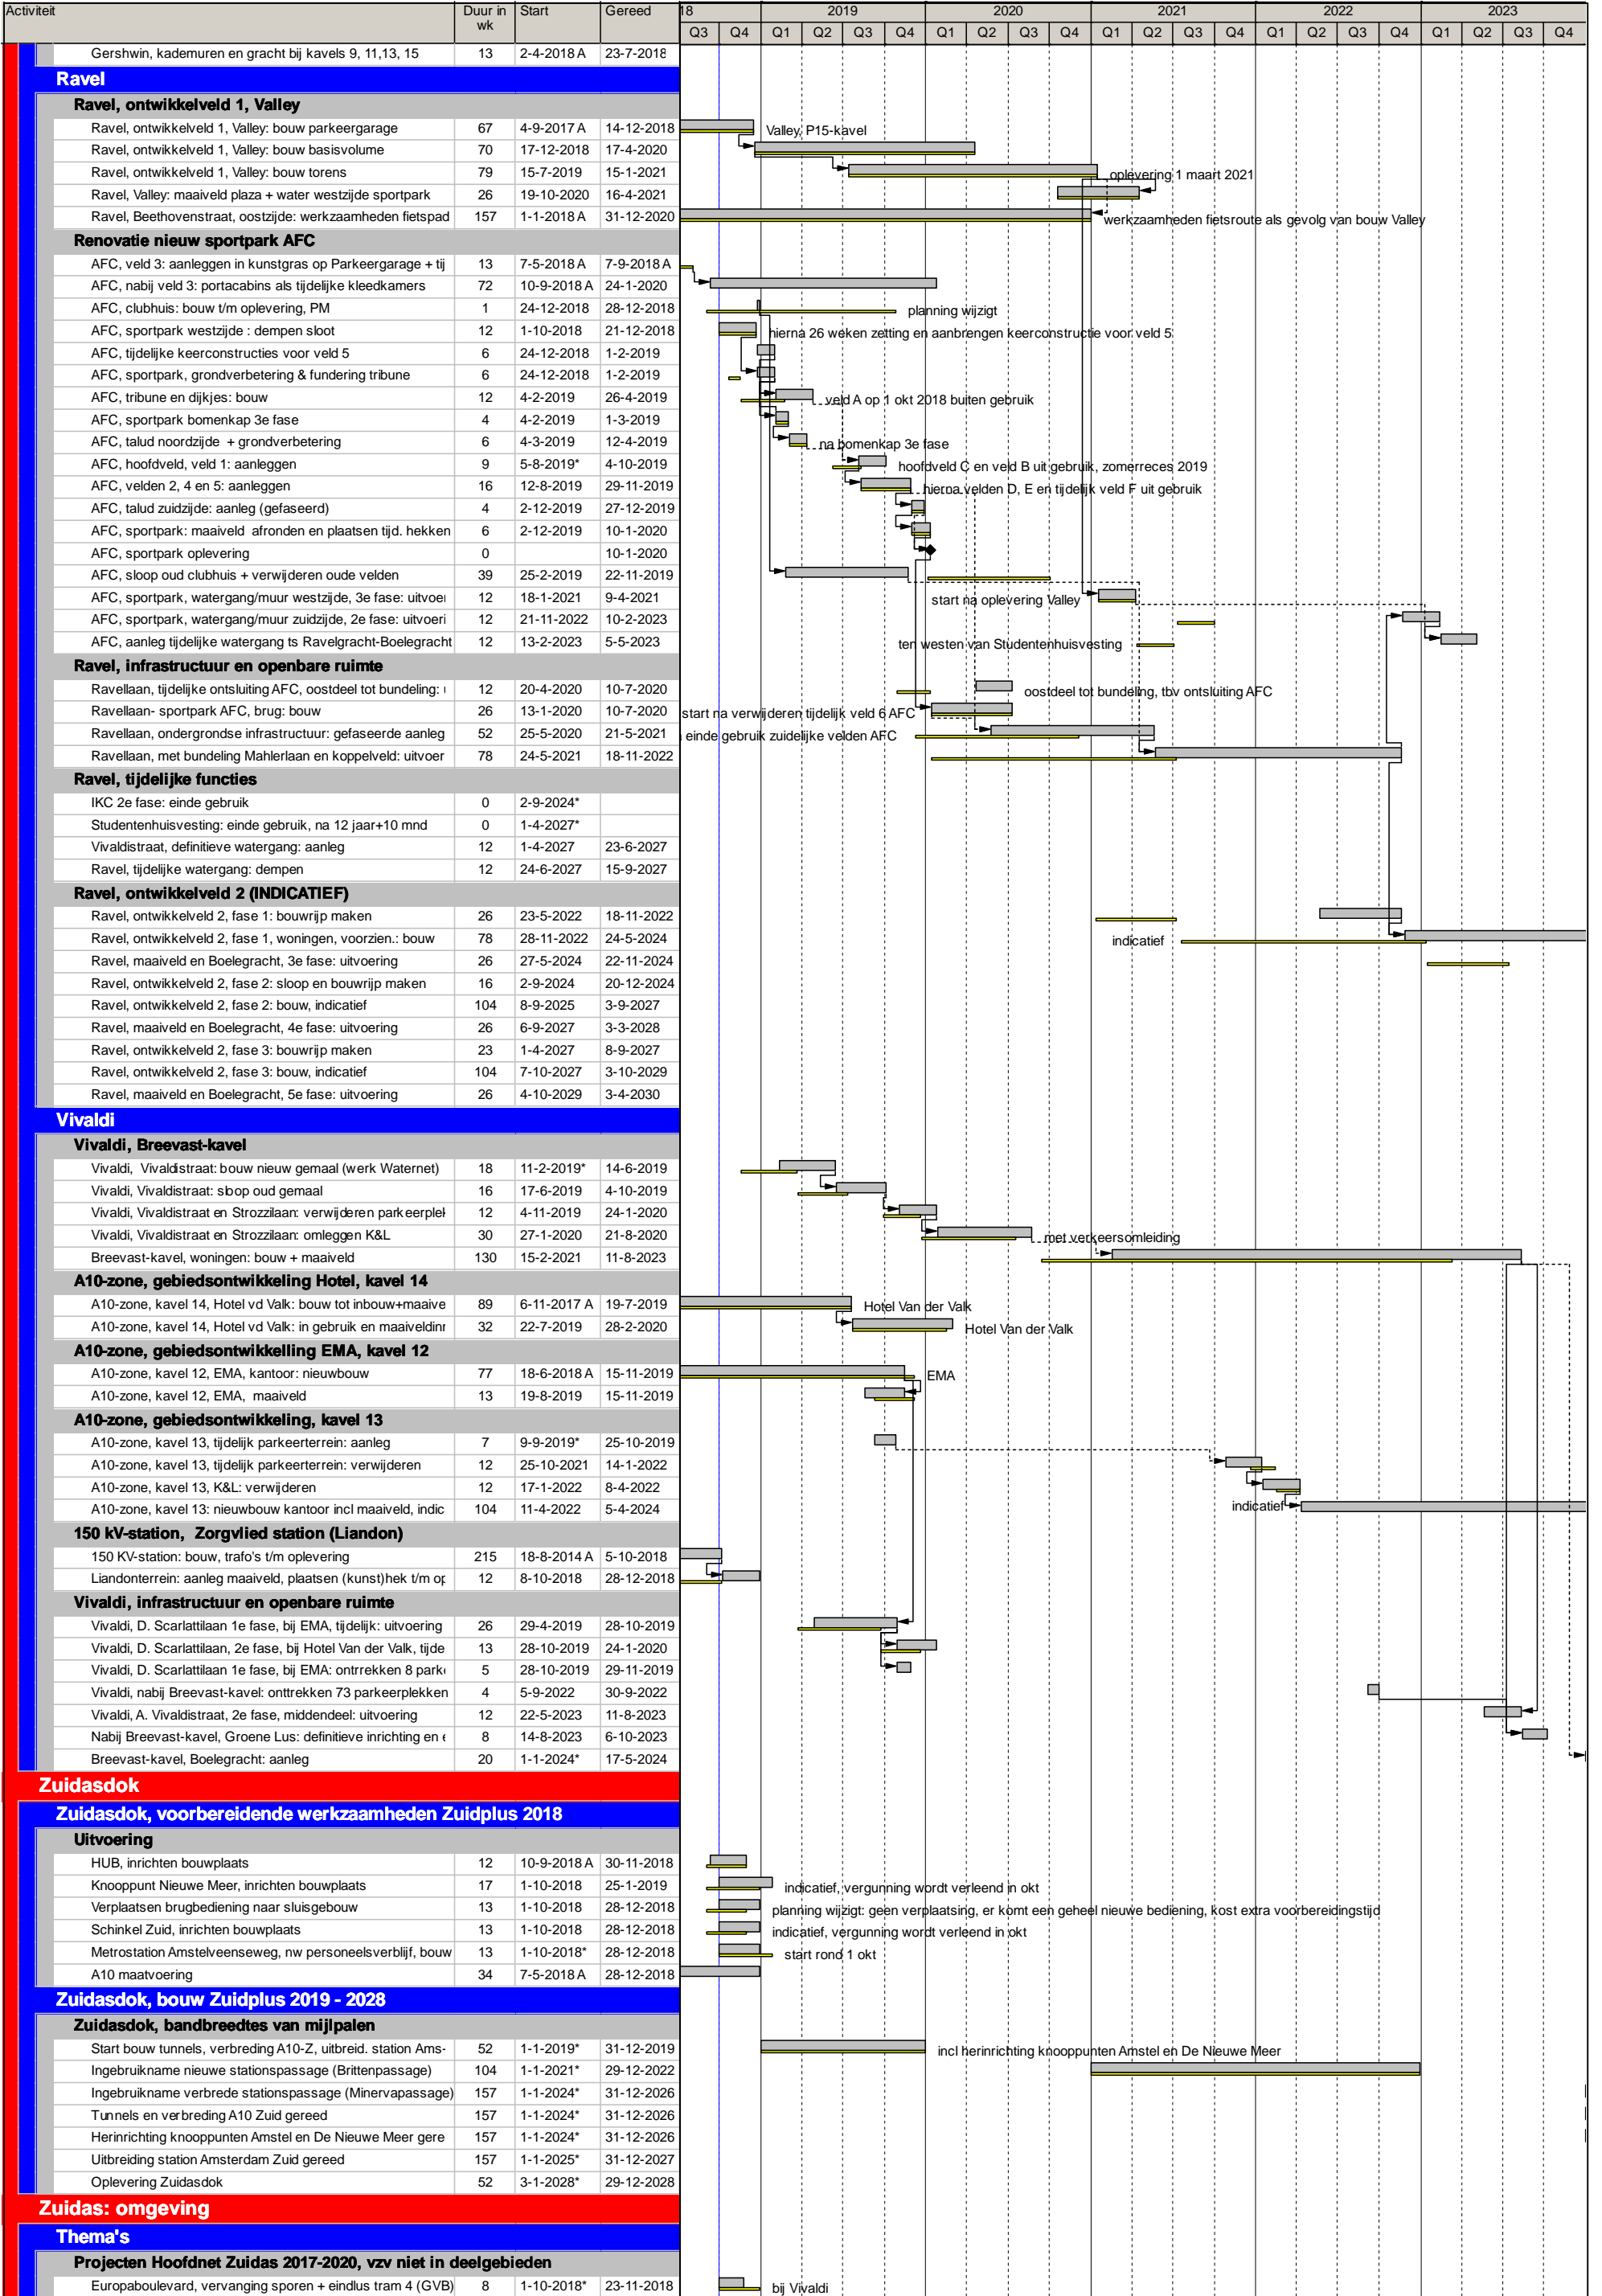

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018				2019				2020				2021				2022				2023			
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Europaboulevard-P. Kennedyln, vervanging sporen en tram	8	1-10-2018*	23-11-2018					tussen RAI en Kop Zuidas																			
Parnassusweg, herinrichting en aanleg tramspoor (GVB)	52	1-1-2019*	30-12-2019					tussen Roeskestraat en Strawinsky																			
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting	39	2-4-2018 A	28-12-2018					ten noorden van Zuidas-gebied																			
Amstelveenlijn, uitvoering (Amstelveen)	89	6-5-2019*	15-1-2021					ten noorden van Zuidas-gebied								conditionerende werkzaamheden in 2017 en 2018											
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervang (N)	18	1-10-2018*	31-1-2019					bij Fred Roeskestraat																			
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervang (M)	18	1-10-2018*	31-1-2019					bij Kenniskwartier																			
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervang (MET)	18	1-10-2018*	31-1-2019																								
Amstelveen, Beneluxbaan-Rembrandtweg ongelijkvloers	60	1-7-2019*	21-8-2020																								
Amstelveen, Beneluxbaan-Zonnestein ongelijkvloers	60	1-7-2019*	21-8-2020																								
Amstelveen, reconstructie Keizer Karelweg - Gr. v. Prinster	26	1-1-2019*	1-7-2019																								
Amstelveen, Keizer Karelweg - Stadsplein, ombouw noordta	26	1-1-2019*	1-7-2019																								
Omgeving																											
Werken derden																											
Strawinsky, Beethovenstr, Pr Irenestraat w-zijde, W. Kesstr	52	4-3-2019*	28-2-2020					werk Waterwet, stadsdeel Zuid																			
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O)	85	4-9-2017 A	26-4-2019					olv V & OR																			
RAI-Europaboulevard, fietsviaduct en aanleg DT-riool	4	30-7-2018 A	24-8-2018																								
Kop Zuidas, aanleg DT-riool langs A10 + oversteek Gaastei	9	24-9-2018 A	23-11-2018																								
Buitenveldertsehn, ten Z v De Boeleln, groot onderhoud (V8)	51	6-1-2020*	25-12-2020																								
Verdi, IJsbaanpad, tpv Het Witte Huis: uitvoering	22	4-2-2019*	5-7-2019																								
Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte																											
Uitbreiding fietsent+metrohal: bouw incl maaiveld (A'dam)	35	3-9-2018 A	31-5-2019					bouw olv MET, sloop okt 2018 gereed, tijd maaiveld gereed feb 2019, def. maaiveld gereed okt 2019																			
Noord Zuidlijn, probabilistische mijlpalen																											
Inbouw techniek, afbouw, testfase	265	1-10-2012 A	23-7-2018																								
Omgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok																											
Piet Kranenbergpad: uitvoering	34	4-9-2017 A	21-12-2018																								
Sporendriehoek, hulpwarmtecentrale: bouwrijp maken	9	3-12-2018*	1-2-2019																								
Sporendriehoek, hulpwarmtecentrale: realisatie tot ingebruik	83	4-2-2019	4-9-2020					in gebruik na rpe op 1 okt 2020																			
